

知床五湖地上歩道再整備等の工期について

釧路自然環境事務所

1. 第 37 回知床五湖利用のあり方協議会で上がった主な意見

地元意見	回答
・10 月以降の工事を希望	10 月以降の工事では工事期間が短いため、秋工事のみの場合 5 年程度の期間が必要となるが、工事予算は長期間継続して確保することが難しく、完成させるためには工期を最長 3 年としたい。
・工事と利用を同時に行えないか	工事区間と利用区間を分ける（大ループを開放し、小ループを工事等）ならば検討は可能。同じ箇所における工事と利用の同時実施は安全面で課題があるため、不可能。
・ガイドとして手伝える事も可能	ガイドによる工事への協力は事故が起きた場合の責任等に課題があるため、利用者対応等の面でご協力いただきたい。

2. 再整備スケジュールについて（裏面資料参照）

<スケジュール検討の条件>

- ・3 年間以内に完了できる期間を設定
- ・利用者の多い時期にはできる限り地上歩道を開放する
- ・ヒグマ活動期は受注者の安全を考え基本的に工事をしない

3. 高架木道の更新工事の実施時期について

高架木道は完成から 7 年以上が経過し今後の劣化が懸念されるため、施設の更新及び長寿命化等の検討を開始する。検討の中で、更新工事にかかる期間（年数）の目安を検討するため、工事可能な時期を確認したい。なお、更新工事にかかる期間（年数）を設計業務等で検討し、再度本協議会にて報告・相談する予定。

工事時期案

案 1 9 月 ～ 翌年 5 月

案 2 10 月 ～ 翌年 5 月


案 3 10 月中旬 ～ 翌年 5 月

* 工事が遅延した場合等、翌年度にずれ込むこともあり。


* 工事箇所を利用者が通過することは危険を伴うため、高架木道の工事中は高架木道の利用禁止、それに伴う地上歩道の運用変更についても要検討。

【知床五湖 地上歩道再整備工事スケジュール(案)】

案1.【秋3年施工案】

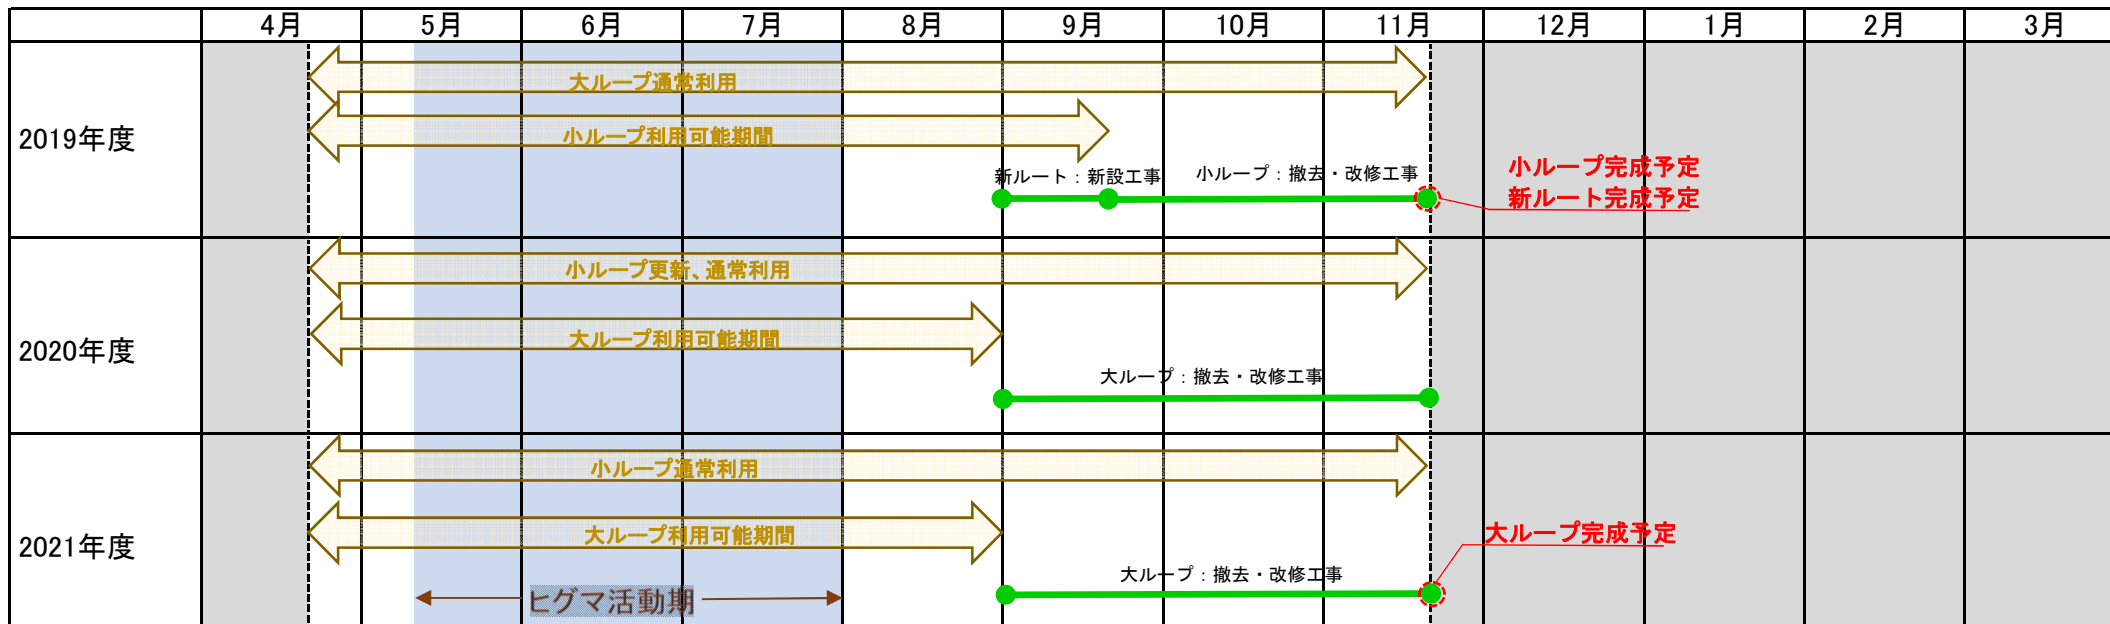

案2.【秋～冬～秋施工案】

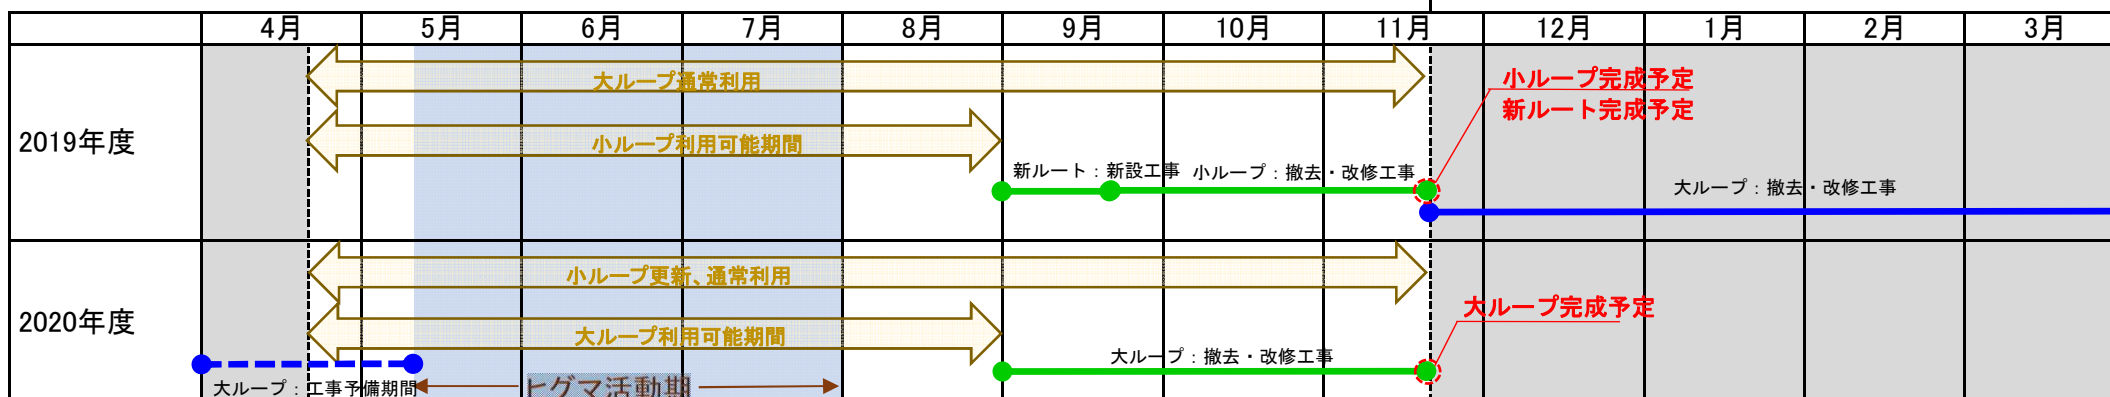

道道93号線 冬期閉鎖

道道93号線の除雪作業、敷地内除雪作業が必要

案3.【冬2年施工案】



工事が遅延した場合の完成予定

	工事 期間	利用制限（○：利用可、×：利用不可） ※1			一般への 広報	資材置場確保によ る利用への影響 ※3	除雪	重機使用に よる植生へ の影響	その他
		工事 時期	SW	冬					
案1： 秋3年施工案	3年	1年目 秋	小L×、大L○	○	不要※2	有	不要	大	橋脚撤去に重機 が必要になるが 秋だと周囲の地 盤や植生に影響 が出る可能性が ある
		2年目 秋	小L○、大L×	○	必要(大L×)	有	不要	大	
		3年目 秋	小L○、大L×	○	必要(大L×)	有	不要	大	
案2： 秋冬秋施工案	2年	1年目 秋	小L×、大L○	—	必要(冬×)	秋：有 冬：なし	不要	秋：大 冬：小	橋脚撤去に重機 が必要になるが 冬だと周囲の地 盤や植生に影響 が出る可能性が 低い
		1年目 冬	—	全線×	必要(冬×)	秋：有 冬：なし	必要	秋：大 冬：小	
		2年目 秋	小L○、大L×	○	必要(大L×)	有	不要	大	
案3： 冬2年施工案	2年	1年目 冬	○	全線×	必要(冬×)	なし	必要	小	案2と同じ
		2年目 冬	○	全線×	必要(冬×)	なし	必要	小	

※1 小L：小ループ、大L：大ループ、SW：シルバーウィーク、冬：1月下旬～3月下旬の利用

※2 小ループ利用ができない場合は、高架木道を歩いてもらうことで代用するため、広報は不要としている。

広報はツアー等に影響が出ないよう、2018年度から周知を開始する必要がある

※3 冬場の利用者が多くないことを考慮し、冬場における駐車場確保による利用への影響は、「なし」としている
